



**El futuro
es de todos**

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN - SPI

Dirección de Inversión y finanzas públicas

Subdirección de Proyectos e Información para
la Inversión Pública -SPIIP

Julio, 2019




1. ¿QUÉ ES EL SPI Y PARA QUÉ SIRVE?

2. METODOLOGÍA PARA HACER USO SPI

1. ¿QUÉ ES EL SPI Y PARA QUÉ SIRVE?




¿Qué es el SPI y para qué sirve?

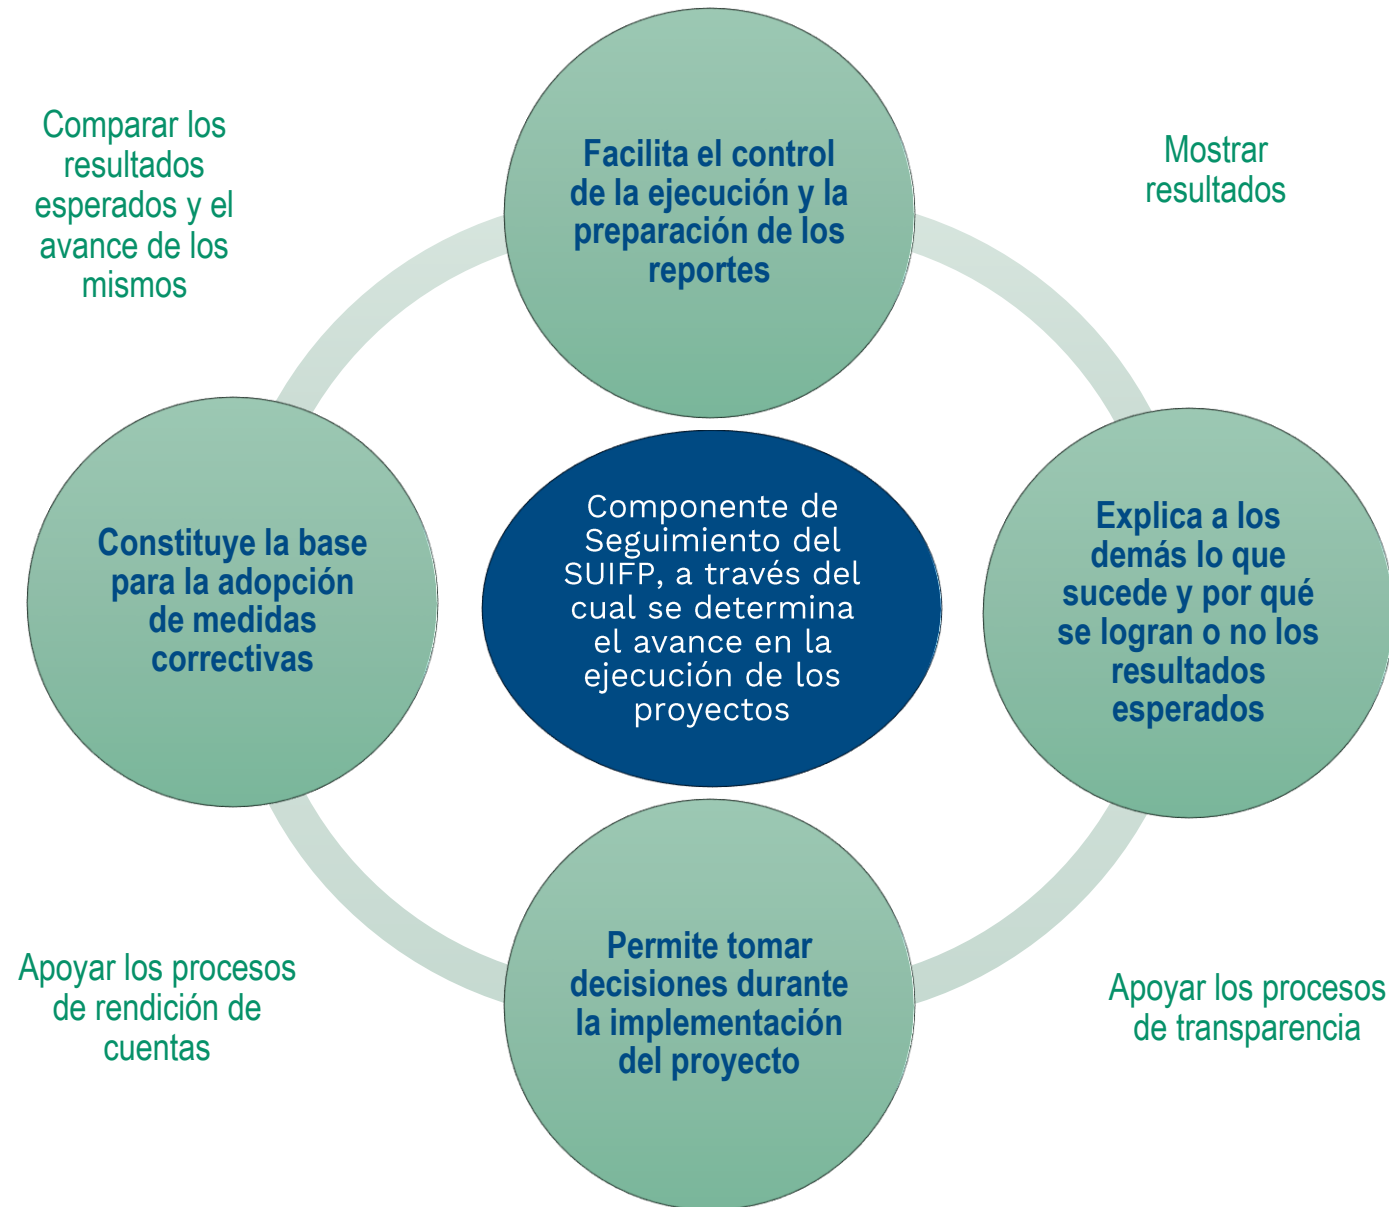

2. METODOLOGÍA PARA HACER USO SPI



Metodología para hacer uso del SPI

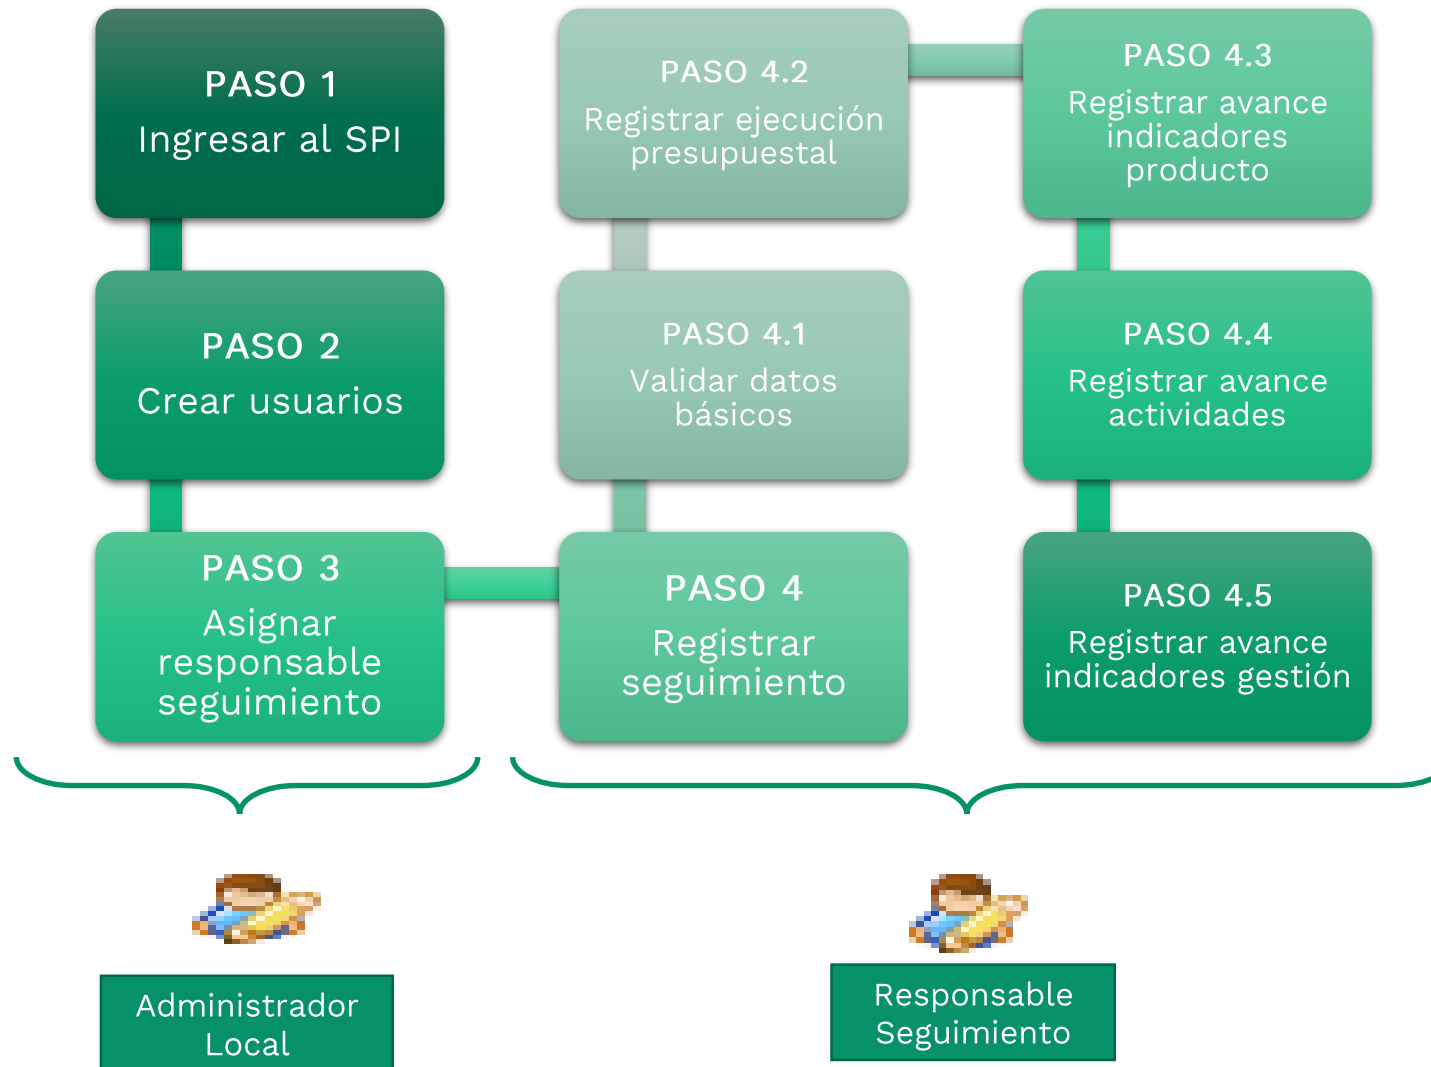

Paso 1.

Ingresar al SPI



Ingresar al SPI

<https://spi.dnp.gov.co/>

SPI

- Si va acceder como ciudadano, utilice el enlace "Usuario Anónimo".
- Si usted es usuario del SPI, y ya es un usuario de la MGA Web o del SUIFP, favor ingresar con el tipo y No. de documento y clave que utiliza en éstos sistemas.
- Si usted es usuario del SPI y es funcionario o contratista del DNP, utilice el enlace "Usuarios DNP".
- Si usted no hace parte de los anteriores grupos de usuarios, a la cuenta de correo que tiene registrada en el SPI, se le enviará un enlace para que registre su nueva clave de acceso.



* Campos requeridos



Iniciar sesión

Tipo de documento de identificación *

Seleccione

Número de documento de identificación *

Número de documento de identificación

Contraseña *

Ingresar
Usuarios DNP

[¿Olvidó su contraseña?](#)

[Usuario anónimo](#)

Seleccione el tipo de documento con el que se registró

Digite número de identificación con el que se registró

Digite la contraseña del registro

Pulse el botón para ingresar



El futuro
es de todos


DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Paso 2.

Crear Usuarios



Creación usuarios



Administrador
Local

Crea los usuarios del SPI
para la entidad territorial y
los notifica.




Seguimiento Territorio

Seguridad Territorio

2. Grabe la
información

3. Notifique al usuario su
creación, para que este
asigne su contraseña

Entidad Usuario:
[Cerrar Sesión](#) [Cambiar Clave](#)



[Inicio](#) | [Seguridad Territorio](#) | [Usuarios](#) | [Crear](#)

Crear Usuarios

Tipo documento
Primer Nombre
Primer Apellido
Correo electrónico
Teléfono
Departamento:
Entidad Territorial
Entidad
Perfil
Estado
PASO:

Icons: [User] [Email] [Add]

Form fields:

- Tipo documento: Cedula de Ciudadanía *
- Número documento: *
- Segundo Nombre: *
- Segundo Apellido: *
- Dirección: *
- Departamento: Antioquia *
- Municipio: SIN MUNICIPIO *
- Entidad Territorial: NARINO *
- Entidad: NARINO - NARINO-0352 *
- Perfil: Responsable Seguimiento *
- Estado: Habilitado *

1. Digite la información básica del
usuario

Paso 3.

Asignar Responsable de Seguimiento

Asignación responsable de seguimiento

Seguimiento Territorio **Seguridad Territorio**

Usuarios
Asignar Responsables
Asignar Responsables

Inicio | Seguridad Territorio | Asignar Responsables | Asignar Responsables

Asignar Responsables a Proyectos

Código BPIN: Usuario:

Nombre del Proyecto:

Proyectos - Entidad: NARIÑO

Usuarios - Entidad: NARIÑO

Perfil a Asignar: Responsable Seguimiento

Administrador Local

Asigna el Responsable del proyecto (gerente o supervisor), por código BPIN

Seleccionar Todos	Entidad	Código BPIN	Proyecto	Responsable	Nombre Usuario	Usuario Entidad
☐	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520001	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y COBERTURA DIGITAL TIC DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO NARIÑO	(No Asignado)		
☐	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520002	FORTALECIMIENTO DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL PARA MEJORAR EL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA NARIÑO	(No Asignado)		
☐	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520004	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN NARIÑO	(No Asignado)		
☐	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520006	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DE NARIÑO CISNA EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO	(No Asignado)		
☐	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520007	FORTALECIMIENTO DE LAS TICS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO NARIÑO	(No Asignado)		
☐	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520008	DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE GANA(GOBIERNO ABIERTO EN LÍNEA) EN NARIÑO	(No Asignado)		
☐	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520010	IMPLEMENTACIÓN DESARROLLAR LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO NARIÑO	(No Asignado)		
☐	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520013	ESTUDIOS TECNICOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO SOBRE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y SU DIVULGACION NARIÑO	(No Asignado)		
☐	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520019	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA DE LOS ENTES TERRITORIALES NARIÑO	(No Asignado)		
☐	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520020	FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	(No Asignado)		

Asigne responsable por proyecto, buscando BPIN

Escoja el responsable asignar de la lista de usuarios creados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>


Paso 4.

Registrar el seguimiento




Reporte de seguimiento

<https://spi.dnp.gov.co/>



Responsable
Seguimiento



Ingresa al SPI

SPI

- Si va acceder como ciudadano, utilice el enlace "Usuario Anónimo".
- Si usted es usuario del SPI, y ya es un usuario de la MGA Web o del SUIFP, favor ingresar con el tipo y No. de documento y clave que utiliza en éstos sistemas.
- Si usted es usuario del SPI y es funcionario o contratista del DNP, utilice el enlace "Usuarios DNP".
- Si usted no hace parte de los anteriores grupos de usuarios, a la cuenta de correo que tiene registrada en el SPI, se le enviará un enlace para que registre su nueva clave de acceso.



* Campos requeridos

Pulse el botón para
ingresar

Seleccione el tipo de
documento con el que
se registró

Digite número de
identificación con el que
se registró

Digite la contraseña del
registro

[¿Olvidó su contraseña?](#)

[Usuario anónimo](#)



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Reporte de seguimiento



Responsable
Seguimiento

Registra el seguimiento del
proyecto y realiza la
focalización de recursos



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

SPI .dnp.gov.co
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Seguimiento Territorio

Entidad Usuario:
[Cerrar Sesión](#) [Cambiar Clave](#)

➔ Registrar Seguimiento
• Registrar Seguimiento
🔍 Consultar Seguimiento
📋 Diagnóstico

B
U
S
C
A
D
O
R

[Inicio](#) | [Seguimiento Territorio](#) | [Registrar Seguimiento](#) | [Registrar Seguimiento](#)

Registro



Icono para ejecutar la
búsqueda

Código BPIN:
Nombre del Proyecto:
Entidad Territorial: Entidad:
Responsable:
Vigencia Desde: Periodo: Diciembre Periodicidad: MENSUAL
Vigencia Hasta: Periodo: Mayo Periodicidad: MENSUAL

Aquí se ven los proyectos de
los cuales es responsable de
seguimiento el usuario

Fecha límite de Registro de Información: 12/02/2018

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Compleitud	Cerrar Proyecto
2017003050028 - APOYO A LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN EXPLOTAR Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS EN ANTIOQUIA	ABIERTO	26/01/2018 9:38:19 a. m.	2018 5-Mayo		0,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión	☐



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

¿Cómo entender el tablero de control?

Indica si el proyecto se encuentra en ejecución y esta habilitado para registrar avance en las variables

Mes habilitado para registrar seguimiento

Fecha límite de Registro de Información: 12/02/2018

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Compleitud	Cerrar Proyecto
2017003050028 - APOYO A LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN EXPLOTAR Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS EN ANTIOQUIA	ABIERTO	26/01/2018 9:38:19 a. m.	2018 5-Mayo		0,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión	☐

Última fecha en la que se viabilizó el proyecto "Registrado Actualizado"

Avance en las metas de los indicadores de producto (incluye registro cualitativo)

% Avance Físico de producto = Sumatoria de (Av. Vigencia del indicador de producto cadena de valor / Meta Vigente * Peso % * 100)



¿Cómo entender el tablero de control?

Avance en las metas de los indicadores de gestión
(incluye registro cualitativo)

$\% \text{ Avance Gestión} = \text{Sumatoria de (Avance Vigencia Indicador Gestión / Meta Vigente * Peso \% * 100)}$

Módulos de seguimiento
que se deben registrar

Fecha límite de Registro de Información: 12/02/2018

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Compleitud	Cerrar Proyecto
2017003050028 - APOYO A LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN EXPLOTAR Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS EN ANTIOQUIA	ABIERTO	26/01/2018 9:38:19 a. m.	2018 5-Mayo		0,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión	☐

Ejecución presupuestal por
actividad (incluye registro cualitativo)

Ejecución presupuestal por
proyecto (incluye
Focalización)

$\% \text{ Avance Financiero} = (\text{Obligación} / \text{Apropiación Vigente}) * 100$

Opción para dar por terminado
el proyecto una vez este ha
cumplido su ejecución




Paso 4.1

Validar Datos Básicos



1

Validación datos básicos del proyecto



Responsable
Seguimiento

Seguimiento Territorio

Módulos de seguimiento
Rojo: sin registro – registro incompleto
Verde: reporte de seguimiento realizado

Entidad Usuario:
[Cerrar Sesión](#) [Cambiar Clave](#)

Registrar Seguimiento

Registrar Seguimiento

Consultar Seguimiento

Datos Básicos del Proyecto



1

Datos Básicos

2

Presupuestal

3

Productos

4

Actividades

5

Gestión

Anexos

1. Imagen alusiva al proyecto, archivo en .jpg o .gif, tamaño máximo 21.000 Kb.

pendiente

Imagen [Cargar](#)

Resumen Ejecutivo [Cargar](#) [Resumen](#)

2. Documento elaborado para la observación pública del estado y de las perspectivas del proyecto de inversión. archivo .pdf, tamaño máximo 21.000 Kb.

Información General .. (clic para expandir)

Resumen Avances .. (clic para expandir)

Cadena de Valor .. (clic para expandir)

3. Se visualiza y verifica información del proyecto: programa, subprograma presupuestal, objetivo general, descripción, (información registrada previamente en SUIFP)




El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

1

Validación datos básicos del proyecto



Responsable
Seguimiento

6. Terminada la verificación de la información valide el módulo a través de este botón
Hecha la validación, el sistema pasará el botón de datos básicos de color rojo a verde.

Módulos de seguimiento
Rojo: sin registro – registro incompleto
Verde: reporte de seguimiento realizado

Entidad Usuario:
[Cerrar Sesión](#) [Cambiar Clave](#)

Registrar Seguimiento
• Registrar Seguimiento

Consultar Seguimiento

Diagnóstico

Datos Básicos del Proyecto

Datos Básicos **Presupuestal** **Productos** **Actividades** **Gestión** **Anexos**

2017003050028 APOYO A LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN EXPLOTAR Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS EN ANTIOQUIA 2017 - 2020

Entidad Territorial: ANTIOQUIA **Entidad:** ANTIOQUIA

Apropiación Vigente 2018: \$250.000.000,00

Responsable: PAULA ANDREA MONTOYA MONROY-ANTIOQUIA

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 26/01/2018 09:38:19 a. m.

Fecha Límite de Registro: 14/06/2018

Periodo: 2018 - Mayo
[Ficha EBI\(26/01/2018\)](#)

Resumen Ejecutivo [Cargar Resumen](#)

Información General .. (clic para expandir)

Resumen Avances .. (clic para expandir)

Cadena de Valor .. (clic para expandir)

4. El usuario observará la ejecución financiera histórica del proyecto, así como sus avances: físico, financiero y de gestión

5. Se encuentra la cadena de valor del proyecto (información registrada previamente en el SUIFP), para que sea verificada.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación


Paso 4.2

Registrar Ejecución Presupuestal



2

Registrar ejecución presupuestal



Responsable
Seguimiento

Por Fuente de Financiación

2

Ejecución Presupuestal del
Proyecto-Vigencia



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Anexos



● Ejecución Vigencia

	Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
	Departamentos - 0454 - NORTE DE SANTANDER - Propios	\$0,00	\$1.289.229.000,00	\$382.500.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00	Regionalización Focalización
	Total Proyecto	\$0,00	\$1.289.229.000,00	\$382.500.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00	

Registra



● Ejecución Vigencia

	Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
	Departamentos - 0454 - NORTE DE SANTANDER - Propios	0,00	1289229000,00	0	0,00	0,00	0,00	Focalización
	Total Proyecto	\$0,00	\$1.289.229.000,00	\$382.500.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00	

Corresponde al valor asignado al proyecto por Decreto de liquidación

Corresponde al valor inicial del proyecto +/- trámites presupuestales

Valor de los contratos o convenios legalmente suscritos

Valor por bienes o servicios recibidos a satisfacción, en el desarrollo de los contratos o convenios suscritos

Corresponde al valor desembolsado por la obligación al beneficiario



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



Responsable Seguimiento

2 Registrar ejecución presupuestal

2

Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Anexos

Focaliza los recursos que contribuyen (directa y/o indirectamente) al cumplimiento de la política transversal

Ejecución Vigencia

	Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
	Departamentos - 0454 - NORTE DE SANTANDER - Propios	\$0,00	\$1.289.229.000,00	\$382.500.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00	Regionalización Focalización
	Total Proyecto	\$0,00	\$1.289.229.000,00	\$382.500.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00	


Este botón remite a la ventana para focalizar los recursos en las políticas transversales asociados al proyecto de inversión

Tipo de Fuente	Inicial	Ref. Valor Formulación	Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Departamentos - 0454 - NORTE DE SANTANDER - Propios	\$0,00	\$1.289.229.000,00	\$1.289.229.000,00	\$382.500.000,00	\$0,00	\$0,00

Indígenas - Norte de Santander Asignación Vigente: \$0,00

	Categoria	Apropiacion Inicial	Apropiacion Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
	Toledo Kuitua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Distribuido	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

2 Registrar ejecución presupuestal



Responsable
Seguimiento

Puede adicionar políticas transversales

2



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Anexos



Tipo de Fuente	Inicial	Ref. Valor Formulación	Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Departamentos - 0454 - NORTE DE SANTANDER - Propios	\$0,00	\$765.540.000,00	\$765.540.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

	Política	Categoría
 	Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Actividades de innovación

Indígenas - Norte de Santander Asignación Vigente: \$0,00

	Categoría	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
	Tibú Catalaura	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	Total Distribuido	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Indígenas - Norte de Santander Asignación Vigente: \$0,00

	Categoría	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
 	Tibú Catalaura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Distribuido	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Focaliza Recursos

Paso 4.3

Registrar Ejecución Física



3

Registrar avance indicador de producto



Responsable
Seguimiento

Se debe desplegar el **objetivo** y posteriormente el **producto** para llegar al Indicador del Producto y registrar avance.

click

3

Indicadores de Producto

Datos Básicos Presupuestal **Productos** Actividades Gestión Anexos

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad para atender el proceso de desminado humanitario

PRODUCTO: Dotación de mobiliario ... (Click para expandir)

Indicador del Producto

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida.	% Peso 2018	Meta Total Proyecto 2017 - 2020	Avance Acumulado 2017	Meta Vigente 2018	Avance Vigencia 2018	Meta Rezagada 2017	Avance Rezago 2018	Regionalizable 2018	% Avance Vigencia 2018	% Meta Rezago 2018	Observación Mensual
	410106300 Planes de acción articulados	Número - Número: Cantidad	100	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,00	0,00	

Documenta o justifica el avance alcanzado, bien sea inferior o superior a la meta establecida

Avance de la meta del indicador de producto a la fecha



El futuro
es de todos


DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Paso 4.4

Registrar Seguimiento de Actividades

4

Registro de avance de actividades



Responsable
Seguimiento

Se debe desplegar el **objetivo** y posteriormente el **producto** para llegar a las actividades y registrar su valor obligado – avance cualitativo.

4

Programación y Seguimiento de
Actividades de Proyecto



Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Anexos

Ejecución Financiera	Inicial	Vigente	Obligación	Total Obligado Actividades
FUENTES	\$0	\$250.000.000	\$0,00	\$0,00
Otras Fuentes	\$0	\$0	\$0,00	\$0,00

☒ Ejecución

☐ Cronológico

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad para atender el proceso de desminado humanitario

[OBLIGADO = \$0]

PRODUCTO: Dotación de mobiliario ... (Click para expandir)

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Equipo estudio no técnico y despeje	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00		
	Total Producto			\$0,00	

Registro cualitativo del avance de
la actividad

Valor por bienes o servicios
recibidos a satisfacción, en el
desarrollo de los contratos o
convenios suscritos



El futuro
es de todos


DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Paso 4.5

Registrar Seguimiento de Gestión

5

Registrar avance indicador de gestión



Responsable
Seguimiento

Indicadores de Gestión

✓

Datos Básicos Presupuestal Productos Actividades **Gestión** Anexos

5

Buscar BIS

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso2018	Meta Vigente2018	Avance Vigencia2018	% Avance Vigencia2018	Observación Mensual
	9900G020 Talleres O Actividades De Capacitación Realizados-	Número- Número: Cantidad	100,	70,0000	0,0000	0,00	



Registra

Avance de la meta del
indicador de gestión a
la fecha

Documenta o justifica el avance
alcanzado, bien sea inferior o
superior a la meta establecida

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso2018	Meta Vigente2018	Avance Vigencia2018	% Avance Vigencia2018	Observación Mensual
	9900G020 Talleres O Actividades De Capacitación Realizados	Número- Número: Cantidad	100	70,000	0,0000	0,00	

Peso porcentual
del indicador




El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Anexos



Incluir anexos



Responsable
Seguimiento

Ver Anexos

Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Anexos



 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Imagen pendiente	2017003050028 APOYO A LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN EXPLOTAR Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS EN ANTIOQUIA	2017 - 2020
	Entidad Territorial: ANTIOQUIA Entidad: ANTIOQUIA	
	Apropiación Vigente 2018: \$250.000.000,00	
	Responsable: PAULA ANDREA MONTOYA MONROY-ANTIOQUIA	
	Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 26/01/2018 09:38:19 a. m.	
	Fecha Límite de Registro: 14/06/2018	Periodo: 2018 - Mayo
	Sin Resumen Ejecutivo	Ficha EBI(26/01/2018)

Anexar Documento



(El tamaño de los anexos disponible para este periodo es: 50 Mb)

Seleccionar	Vigencia	Fecha	Descripción	Descarga	Tamaño
-------------	----------	-------	-------------	----------	--------

Pueden anexarse los documentos que se requieran en formato .pdf, .zip y .jpg. Recuerde describir en pocas palabras la información de avance contenida en el documento.

El máximo espacio que cuenta por periodo es de 21 Megabytes.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



**El futuro
es de todos**

DNP
Departamento
Nacional de Planeación
